ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Reiðhöll sörla**	**534 days?**	**Fri 14.4.23**	**Wed 30.4.25**	
2		**Uppsteypa**	**184 days**	**Fri 14.4.23**	**Wed 27.12.2**	
3		Gröftur og fylling undir sökkl	35 days	Fri 14.4.23	Thu 1.6.23	
4		Sökklar félagshúss	10 days	Thu 1.6.23	Wed 14.6.23	
5		Fyllingar inn í sökkla	10 days	Mon 26.6.23	Fri 7.7.23	
6		Frárennslislagnir	5 days	Mon 10.7.23	Fri 14.7.23	5
7		Bornplata félagshúss	5 days	Mon 17.7.23	Fri 21.7.23	6
8		Sökklar og pallar reiðhallar	140 days	Thu 15.6.23	Wed 27.12.2	4
9		Uppsteypa félagshúss	100 days	Mon 24.7.23	Fri 8.12.23	7
10		**Lokun húsa**	**260 days**	**Mon 1.1.24**	**Fri 27.12.24**	
11		Smíði og flutningur stálvirkis	100 days	Mon 1.1.24	Fri 17.5.24	
12		Stálvirki uppsetning	30 days	Mon 20.5.24	Fri 28.6.24	11
13		Þak reiðhallar og félagshúss	90 days	Mon 1.7.24	Fri 1.11.24	12
14		Gluggar	60 days	Mon 1.7.24	Fri 20.9.24	12
15		Veggeiningar	40 days	Mon 4.11.24	Fri 27.12.24	13
16		Klæðningar	40 days	Mon 23.9.24	Fri 15.11.24	14
17		Rafmagn - lagnaleiðir	30 days	Mon 4.11.24	Fri 13.12.24	13
18		**Frágangur innan og utan**	**107 days?**	**Mon 18.11.2**	**Tue 15.4.25**	
19		Stórar hurðir í reiðhöll	10 days	Mon 6.1.25	Fri 17.1.25	
20		Klæðning og tenging félagsh	40 days	Mon 18.11.2	Fri 10.1.25	16
21		Flotun gólfa	10 days	Mon 13.1.25	Fri 24.1.25	20
22		Léttir veggi rog loft	15 days	Mon 27.1.25	Fri 14.2.25	21
23		Handrið	15 days	Mon 20.1.25	Fri 7.2.25	19
24		Málun	40 days	Mon 17.2.25	Fri 11.4.25	22
25		Innréttingar	40 days	Mon 17.2.25	Fri 11.4.25	22
26		Innihurðir og -gluggar	40 days	Mon 17.2.25	Fri 11.4.25	22
27		Gólfefni	20 days	Mon 17.3.25	Fri 11.4.25	
28		Reiðgólf	1 day?	Mon 20.1.25	Mon 20.1.25	19
29		Sæti í stúku	1 day?	Mon 20.1.25	Mon 20.1.25	19
30		Lagnir	75 days	Wed 1.1.25	Tue 15.4.25	
31		Raflagnir	75 days	Wed 1.1.25	Tue 15.4.25	
32		Loftræsing	75 days	Wed 1.1.25	Tue 15.4.25	
33			1 day?	Mon 18.11.2	Mon 18.11.2	

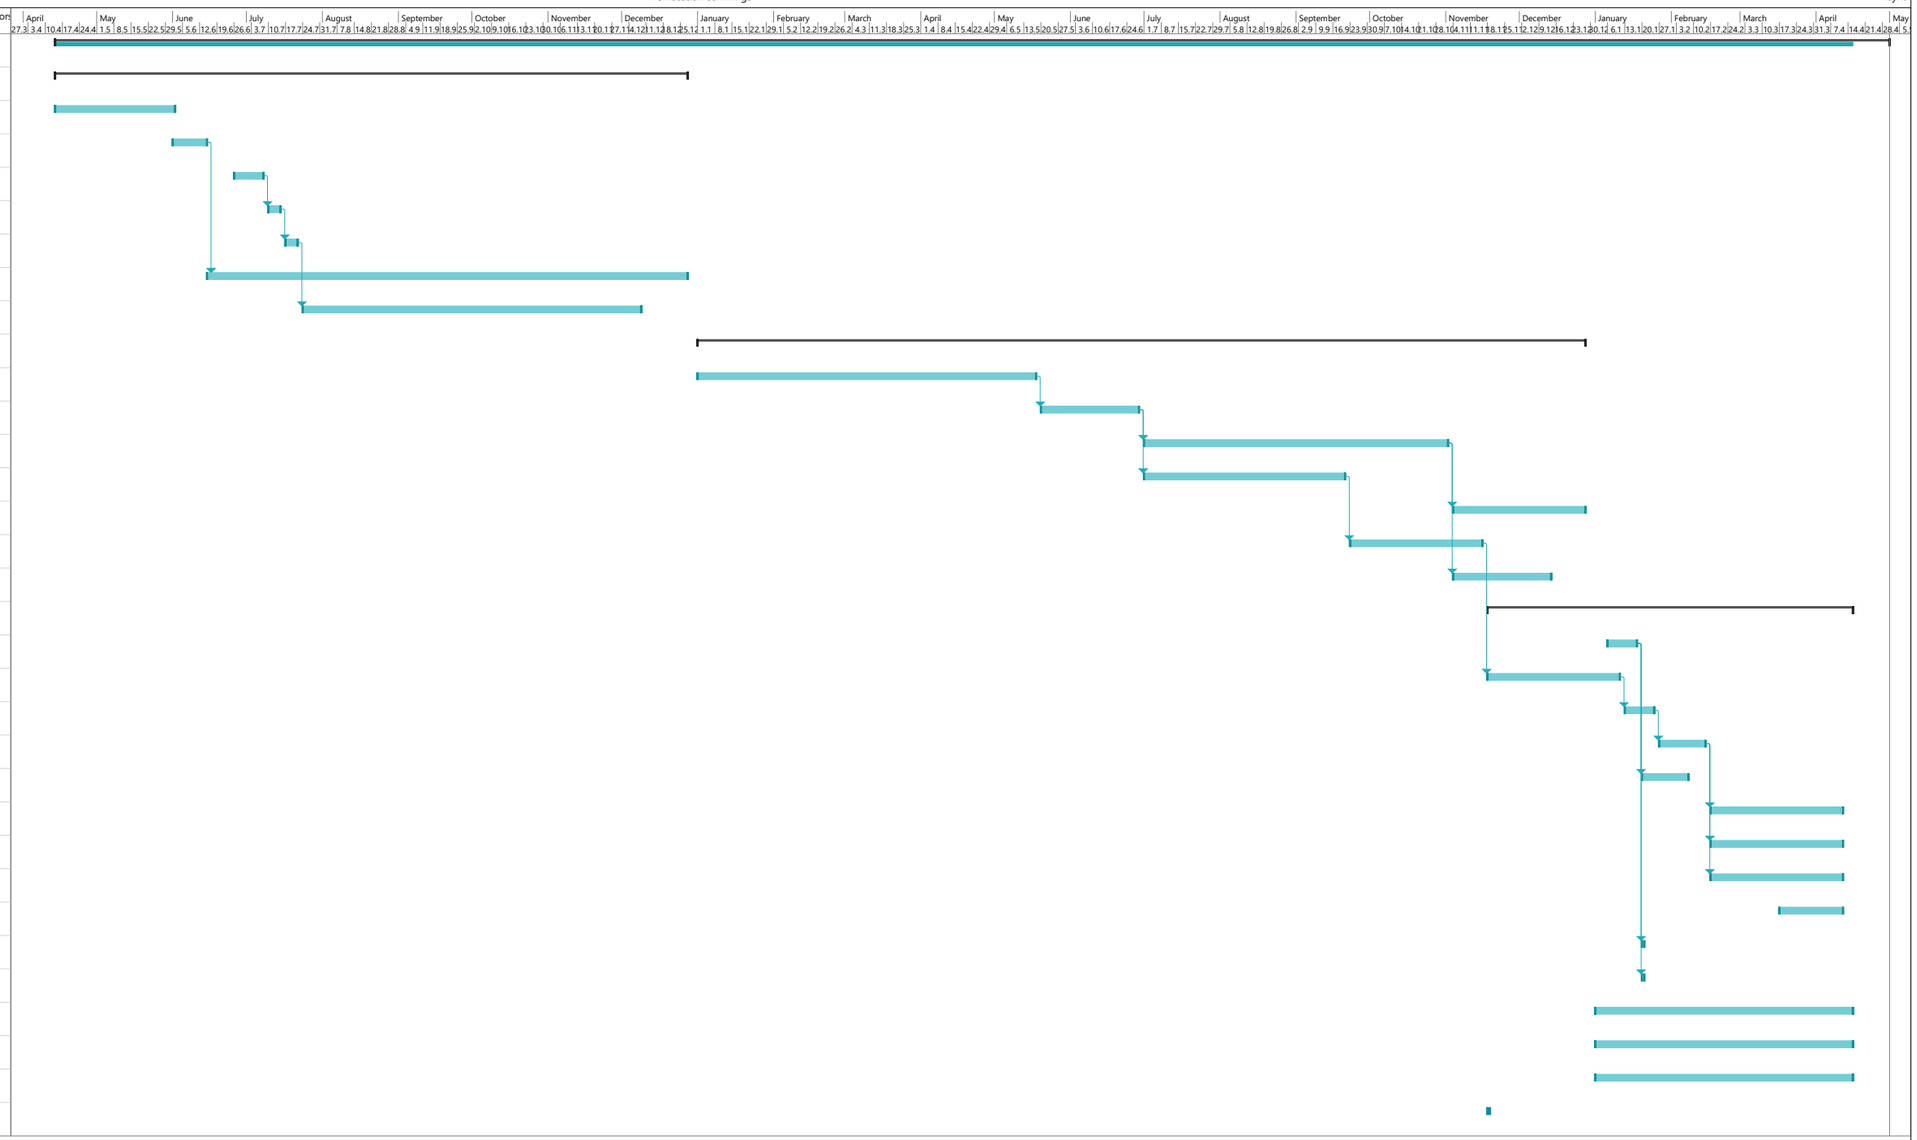

Project: Verkáætlun drög
Date: Mon 26.9.22

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress
